



BUD FRANK

LWÓW / UKRAINA

BF 03 · 17.09.2026 · PL

Dla zamawiającego w ramach programu rehabilitacji weteranów

Szatnia bez barier z natryskami

Oferata handlowa na projektowanie i budowę. Podwyższony standard wyposażenia

Oferujemy realizację modułowego budynku szatni bez barier z natryskami dla weteranów przechodzących rehabilitację, przy kompleksie sportowym w Odessie, w standardzie Bud Frank. Zachowujemy układ funkcjonalny i wygląd zewnętrzny zaproponowany przez zamawiającego, podnosząc dostępność, trwałość elewacji i wykończenia oraz jakość wyposażenia sanitarnego i klimatyzacyjnego.

122 m ²	2 × 25 miejsc	3 moduły
powierzchnia zabudowy	część męska i damska	100% gotowości fabrycznej

Wstępna cena z VAT 20%

239 000 EUR

≈ 1 957,41 EUR/m²

Projektowanie i badania, trzy moduły gotowe fabrycznie, fundament palowy, strefa wejściowa z pochylnią i zadaszeniem, meble w zabudowie, instalacje, transport ponadgabarytowych modułów Lwów - Odessa, montaż, mobilizacja ekipy ze Lwowa i jej zakwaterowanie w Odessie.

Wycena przedprojektowa. Ostateczna cena i rozwiązania zostaną ustalone po opracowaniu projektu. Zagospodarowanie terenu, tablice informacyjne i opłaty za przyłączenie do sieci nie są wliczone w cenę.

Witalij Habow | CEO / dyrektor TOW „BUDFRANK”

+380 98 441 60 91 · @budfrank.ua

01 / EUR

Koszt realizacji

Wszystkie kwoty podano w EUR z VAT 20%. Poszczególne działy obejmują materiały, urządzenia, prace, sprzęt, zarządzanie i koszty w granicach danego zakresu. Transport modułów ze Lwowa, prace dźwigowe i zakwaterowanie ekipy ujęto oddzielnie w dziale 13.

Lp.	Dział	EUR z VAT
1	Projektowanie i badania	3 000
2	Teren budowy i fundament palowy	20 400
3	Moduły: szkielet, poszycia, izolacja termiczna	46 100
4	Pokrycie dachowe	7 700
5	Elewacja wentylowana	11 700
6	Okna i drzwi	12 000
7	Strefa wejściowa: podest, schody, pochylnia, zadaszenie	17 800
8	Wykończenie wnętrz, posadzki, kabiny sanitarne	29 400
9	Meble w zabudowie i wyposażenie	10 000
10	Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja	14 400
11	Wodociąg, kanalizacja, wyposażenie sanitarne	16 800
12	Instalacja elektryczna, oświetlenie, bezpieczeństwo	16 500
13	Logistyka Lwów → Odessa, dźwigi, montaż, zakwaterowanie ekipy	24 900
14	Przyłącza zewnętrzne (założone trasy do 30 m)	6 200
15	Próby, dokumentacja i przekazanie	2 100

Łączna wstępna cena - 239 000 EUR

Dział 13 skalkulowano bezpośrednio, a nie procentowo: zezwolenia i projekt trasy ≈ 790 km dla trzech pojazdów, trzy naczepy niskopodwoziowe, eskortowanie kolumny, żurawie samojezdne we Lwowie i Odessie, osprzęt do podnoszenia i ubezpieczenie, montaż modułów, mobilizacja i zakwaterowanie ekipy 5 specjalistów. Udział działu: 10,4% całkowitej ceny.

Netto: 199 166,67 EUR · VAT: 39 833,33 EUR.

Cena w przeliczeniu na powierzchnię zabudowy: 1 957,41 EUR/m². Podest wejściowy 25 m², pochylnia i zadaszenie 28 m² nie wchodzi do podstawy powierzchni; ich koszt jest już uwzględniony.

02 / OBIEKT

Zakres i program funkcjonalny

Podstawą oferty są układ funkcjonalny „Szatnia”, specyfikacja i wizualizacje zamawiającego z 16.09.2026. Budynek zachowuje gabaryty, lustrzany układ dwóch części, pionowe okna oraz stonowaną srebrno-grafitową elewację.


Parametr	Założenia przyjęte w ofercie
Powierzchnia i gabaryty	14,71 × 8,30 m; powierzchnia zabudowy 122 m²; powierzchnia użytkowa 103 m². Wartości wstępne.
Moduły	Dwa moduły 10,27 × 4,12 m (szatnie po 36,35 m²) i jeden moduł 4,40 × 8,30 m (dwa bloki natrysków po 15,18 m²). Wszystkie instalacje „mokre” skupiono w jednym module.
Części budynku	Męska i damska, oddzielne wejścia z zadaszonego podestu. W każdej: 25 szafek, 5 ławek, przejścia 1,25 m, pola manewrowe Ø 1,5 m; 2 umywalki, standardowa i uniwersalna kabina WC, 2 natryski.
Wysokości	Szatnie: 2,70 m w świetle; bloki natrysków: 2,60 m. Wysokość zewnętrzna modułu ≈ 3,5 m.
Strefa wejściowa	Podest 25 m² na rzędnej +0,45 m, schody z trzech stron, pochylnia o nachyleniu 8% i długości 5,7 m, zadaszenie ≈ 28 m² na pięciu słupach, ławki.
Okna i drzwi	8 okien 0,8 × 1,8 m z bezpiecznym szkłem satynowym; 2 ocieplone drzwi wejściowe 1,1 × 2,2 m z napędem automatycznym; 2 drzwi wewnętrzne 1,0 × 2,1 m; 8 drzwi kabin.
Posadowienie	47 pali śrubowych ocynkowanych ogniowo, z ocynkowanym rusztem; bez robót betonowych w gruncie.



Widok ogólny. W ofercie BF 03 pochylnię wydłużono do 5,7 m (nachylenie 8%); ściana strefy wejściowej i fryz zadaszenia - z kasetonów kompozytowych.

02 / OBIEKT

Układ funkcjonalny i elewacje

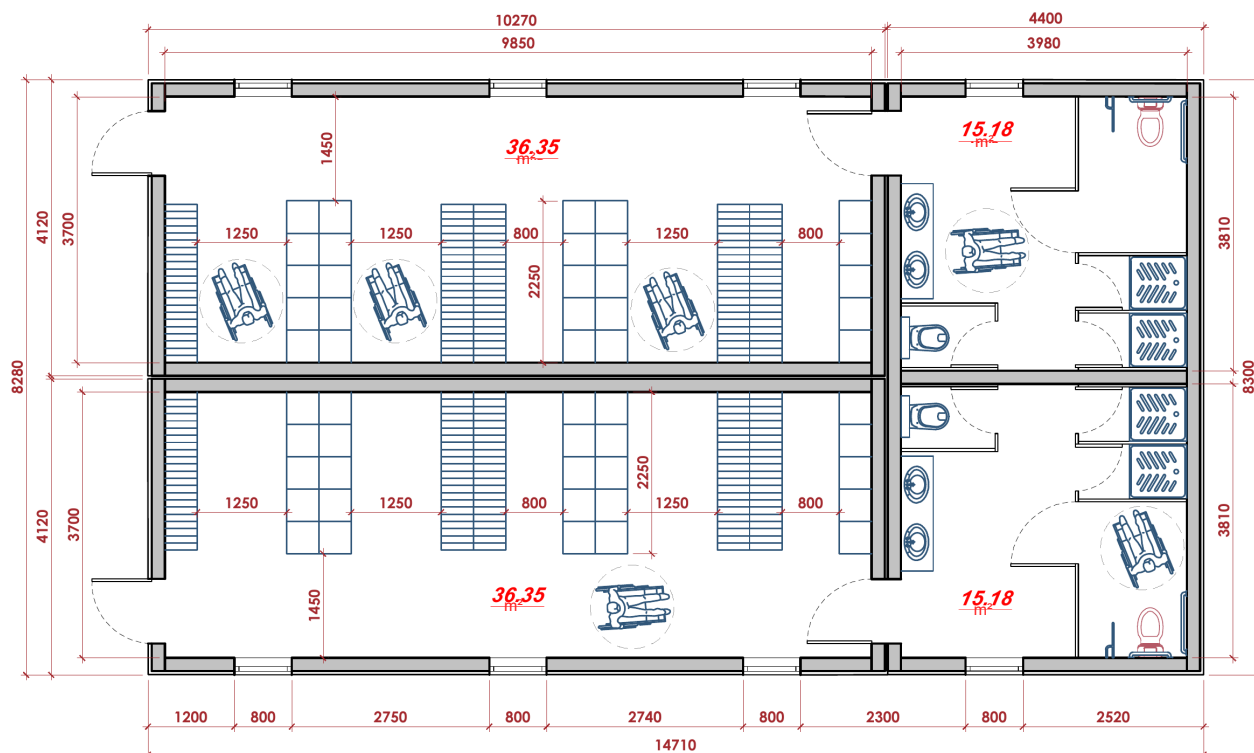

SZATNIA
układ funkcjonalny

Układ funkcjonalny zamawiającego (skala orientacyjna). Wejścia od strony czołowej po lewej, od podestu.



Elewacja frontowa: dwa wejścia, zadaszenie, ławki, schody z trzech stron.

03 / STANDARD WYPOSAŻENIA

Materiały i komponenty Bud Frank

Standard podniesiono tam, gdzie ma to największy wpływ na trwałość i codzienne użytkowanie: ochrona metalu w klimacie nadmorskim, elewacja, ściany szatni, strefy mokre, urządzenia sanitarne i klimatyzacyjne, automatyka wejścia. Wskazane serie są punktem odniesienia dla specyfikacji; zamienniki uzgadnia się na podstawie parametrów i próbek, bez obniżania wymagań.

Strefa	Proponowane wykonanie
Elewacja ≈ 148 m ²	Blacha profilowana klasy Ruukki T20, stal 0,6 mm z powłoką GreenCoat Pural BT, srebrna, na podkonstrukcji z przekładkami termicznymi; niepalne kasetony kompozytowe Alucobond A2 na ścianie strefy wejściowej i fryzie zadaszenia - 30 m ² ; cokół grafitowy. [M1, M2]
Drzwi wejściowe	Ocieplone drzwi metalowe 1,1 × 2,2 m, bezprogowe, z napędami automatycznymi klasy GEZE / dormakaba, przyciskami na dostępnej wysokości i czujnikami bezpieczeństwa. [M3]
Okna	Profil PVC, Uw ≤ 1,0, szyba zespolona z bezpiecznym szkłem satynowym - prywatność bez folii i zasłon.
Ściany szatni ≈ 130 m ²	Płyta odporna na wilgoć 18 mm z powłoką HPL, mocowana w sposób ukryty na podłożu OSB-3: zmywalna powierzchnia odporna na uderzenia, możliwość mocowania szafek i poręczy w dowolnym miejscu.
Ściany stref mokrych ≈ 74 m ²	Gres na pełną wysokość na podłożu odpornym na wilgoć, hydroizolacja stref natryskowych, spoinowanie żywicą epoksydową.
Posadzki ≈ 103 m ²	Gres na całej powierzchni: R10 w szatniach, R11 w blokach natrysków; płyta cementowo-wiórowa 12 mm na OSB-3 22 mm, elastyczny klej S1, w strefach mokrych fuga epoksydowa. Na podeście ta sama kolekcja, R11.
Sufity	Szatnie - sufit podwieszany 600 × 600; bloki natrysków - sufit napinany; montaż płyt i membran na budowie po połączeniu modułów.
Kabiny sanitarne 44 m ² + 8 drzwi	HPL compact 12 mm, wys. 2,3 m, własny stelaż, okucia ze stali nierdzewnej; dwoje szerokich drzwi 0,9 m.
Szafki i ławki	50 metalowych szafek z zamkami (4 obniżone, dostępne); 10 ławek 2,0 × 0,45 m ze stelażem nierdzewnym i siedziskiem z jesionu termowanego.
Wypożażenie sanitarne	Miski WC ze stelażami podtynkowymi klasy Geberit, przybory dostępne klasy Villeroy & Boch ViCare, poręcze klasy HEWI, termostatyczne panele natryskowe z ochroną przed oparzeniem, odpływy liniowe. [M4]

Powierzchnie są orientacyjnymi ilościami montażowymi. Zapas zakupowy mieści się w limitach poszczególnych działów i nie jest doliczany osobno. Marka nie zastępuje weryfikacji konkretnego wyrobu: przed zakupem wymagane są karty techniczne, parametry pożarowe i potwierdzenie kompatybilności całego systemu.

04 / KONSTRUKCJA

Konstrukcja i izolacyjność cieplna

Przyjęto moduły przestrzenne o szkieletcie drewnianym, z fabrycznym opracowaniem detali, obliczone na transport ≈ 790 km i podnoszenie dźwigiem w stanie całkowicie wykończonym. Projektowany okres użytkowania wynosi co najmniej 30 lat przy prawidłowej konserwacji; jest to cel projektowy, a nie deklarowana gwarancja.

Element	Układ warstw i parametry do projektowania
Posadowienie	47 pali śrubowych Ø108 × 4 mm, L ≈ 3,0 m, ocynk ogniowy; ruszt z ceowników ocynkowanych ogniowo ≈ 1,2 t; środkowa linia podpór pod każdym modulem. Sondowanie gruntu i próbne wkręcanie w dwóch punktach. Uwzględnia się korozyjne środowisko Odessy.
Szkielet	Suche, strugane drewno C24 z łącznikami MiTek oraz zabezpieczeniem ogniochronnym i biologicznym: słupki 50 × 150, belki 50 × 200. Stalowe ramy transportowe, węzły do mocowania zawiesi i tymczasowe stężenia do transportu na dużą odległość.
Ściana zewnętrzna od zewnątrz do wewnątrz	Blacha profilowana 0,6 mm / kasetony kompozytowe; szczelina wentylacyjna; membrana wiatroizolacyjna; ruszt krzyżowy z wełną mineralną 50 mm; OSB-3 12 mm; słupki z wełną mineralną 150 mm; paroizolacja; OSB-3 9 mm; płyta z powłoką HPL lub gres na podłożu odpornym na wilgoć.
Podłoga od góry do dołu	Gres; płyta cementowo-wiórowa 12 mm; OSB-3 22 mm; paroizolacja; belki 50 × 200 w rozstawie 400 z wełną mineralną 200 mm; membrana; OSB-3 9 mm; siatka; wentylowana przestrzeń podpodłogowa z dostępem.
Dach	Membrana PVC 1,8 mm; OSB-3 18 mm na konstrukcji kształtującej spadek, z warstwą wentylowaną; krzyżowa warstwa wełny mineralnej 100 mm; belki 50 × 200 z wełną mineralną 200 mm; paroizolacja. Spadek na dwie dłuższe strony, zewnętrzne odwodnienie.
Połączenia modułów	Podwójne ściany z wełną mineralną 100 mm w każdym module; styki dachu zgrzewane pasem membrany; kontrola termowizyjna i badanie przepuszczalności powietrza po montażu.

Docelowe efektywne opory cieplne R: ściana ≥ 4,4; dach ≥ 6,5; podłoga ≥ 4,5 m²·K/W; okna $U_w \leq 1,0$ W/(m²·K). Odporność ogniowa i parametry pożarowe wykończenia zostaną potwierdzone projektem i dokumentacją materiałową; same grubości nie stanowią dowodu zgodności.

05 / INSTALACJE

Instalacje techniczne

Założenia obliczeniowe: do 50 użytkowników, temperatura zewnętrzna zimą -18°C, w szatniach +20°C, w natryskach +25°C. Cena obejmuje urządzenia, trasy instalacji, automatykę, montaż i uruchomienie.

System	Wstępne wyposażenie
Wentylacja	Centrala nawiewno-wyiewna ≈ 1 000 m³/h z rekuperatorem $\eta \geq 75\%$ i dogrzewaniem 3 kW; nawiew do szatni, wywiew z natrysków i sanitariatów; 4 wentylatory wyciągowe z czujnikiem wilgotności.
Ogrzewanie i chłodzenie	Dwa inwerterowe systemy split klasy Daikin / Mitsubishi Electric 5 kW, pracujące w trybie grzania do -20...-25°C; 6 rezerwowych konwektorów elektrycznych; elektryczne ogrzewanie podłogowe na 24 m² w blokach natrysków. [M5]
Ciepła woda	4 pojemnościowe podgrzewacze wody po 150 l (600 l, ≈ 24 kąpiele pod natryskiem kolejno, ponowne nagrzanie 4,5-5 h), termostaticzne zawory mieszające. Zwiększenie wydajności na potrzeby intensywniejszego użytkowania - na podstawie projektu.
Przybory sanitarne	4 miski WC (2 uniwersalne), 4 umywalki (2 dostępne), 4 natryski bez barier z odpływami liniowymi i panelami termostaticznymi, poręcze, składane siedziska, suszarki do rąk.
Instalacje wodne	Izolowane rurociągi PPR/PEX, kanalizacja w stropie podłogowym modułu mokrego, zestaw wodomierzowy z filtrem, zabezpieczenie przed wyciekami, ogrzewanie i izolacja przewodów pod podłogą.
Instalacja elektryczna	Rozdzielnica ≈ 25 kW (3 fazy) z ochroną różnicowoprądową wszystkich obwodów; oświetlenie LED, oprawy awaryjne; gniazda ładowania elektrycznych wózków inwalidzkich; zasilanie napędów drzwi; rozłączne połączenia między modułami.
Bezpieczeństwo	System sygnalizacji pożarowej z alarmowaniem, gaśnice; przyzywanie pomocy z kabin uniwersalnych i natrysków, z lampkami sygnalizacyjnymi nad drzwiami.

Konkretne marki i modele zostaną dobrane po obliczeniach i sprawdzeniu dostępności serwisu w Ukrainie. Podane limity kosztorysowe nie stanowią potwierdzonych ofert handlowych producentów. Opcje poza ceną: zasilanie rezerwowe z falownika z akumulatorem (≈ 3 600 EUR), monitoring wizyjny wejść (≈ 1 650 EUR), centrala nawiewno-wyiewna z $\eta \geq 85\%$ (≈ +1 000 EUR).

06 / DOSTĘPNOŚĆ

Rozwiązania bez barier

Budynek przeznaczony jest dla weteranów po amputacjach, poruszających się na wózkach i z niepełnosprawnością wzroku, dlatego dostępność sprawdzono według DBN B.2.2-40:2018, a wyjściową specyfikację skorygowano.

Element	Rozwiązanie Bud Frank
Pochylnia	Nachylenie 8% (długość 5,7 m przy różnicy poziomów 0,45 m), szerokość w świetle 1,2 m, dolny spocznik 1,5 × 1,5 m, podwójne poręcze 0,7 / 0,9 m po obu stronach. W specyfikacji zamawiającego: 4,5 m (nachylenie 10%), co nie odpowiada normie. Opcja: nachylenie 5% (9,0 m), ≈ +1 800 EUR.
Wejście	Drzwi automatyczne z przyciskami na wysokości dostępnej z wózka i czujnikami bezpieczeństwa; przejście ≥ 0,9 m w świetle; bez progów; podest wejściowy na poziomie posadzki.
Natryski	Wszystkie cztery natryski bez barier, z odpływami liniowymi; w każdym bloku jeden ze składanym siedziskiem, poręczami i drzwiami 0,9 m. Brodziki ze specyfikacji nie są stosowane.
Toalety	Kabina uniwersalna w każdym bloku: poręcz uchylna i stała, dostępna umywalka; wymiary nie mniejsze niż 1,65 × 1,80 m zostaną sprawdzone na etapie koncepcji.
Szatnie	Obniżone szafki z haczykami na wysokości 0,4-1,2 m, ławki 0,45-0,50 m, przejścia 1,25 m, pola manewrowe Ø 1,5 m, gniazda do ładowania wózków.
Orientacja	Oznakowanie kierunkowe, tabliczki w alfabecie Braille’a, oznaczenia kontrastowe, pasy dotykowe na podeście i schodach.
Przyzywanie pomocy	Przyciski sznurkowe w kabinach uniwersalnych i natryskach, lampki sygnalizacyjne nad drzwiami.

Transport modułów Lwów - Odessa i montaż

Moduły powstają w zakładzie we Lwowie. Przy szerokości 4,12-4,40 m i wysokości na naczepie ponad 4,0 m stanowią ładunek ponadgabarytowy: przewóz jest możliwy wyłącznie na specjalnych zasadach - zezwolenie dla każdego pojazdu, uzgodniona trasa, pojazdy zabezpieczające i eskorta.

Składnik	Założenia przyjęte w ofercie
Trasa	≈ 790 km: Lwów - Tarnopol - Chmielnicki - Winnica - Humań - Odessa; projekt trasy ze sprawdzeniem mostów, wiaduktów, promieni skrętu i wysokości sieci trakcyjnych w Odessie.
Czas przejazdu	2-3 doby z uwzględnieniem ograniczeń ruchu i godziny policyjnej.
Transport i eskorta	Kolumna trzech naczep niskopodwoziowych ze wspólną eskortą: dwa pojazdy zabezpieczające, policja patrolowa na odcinkach określonych warunkami zezwolenia.
Ochrona modułów	Stalowe ramy transportowe, tymczasowe stężenia, opakowanie ochronne, ubezpieczenie ładunku. Płyty sufitowe, elementy napinane i płytki na stykach montuje się na budowie.
Dźwigi i montaż	Żuraw samojezdny w zakładzie; żuraw samojezdny 100 t na budowie - 1,5 zmiany; trawersy do podnoszenia bez odkształceń; tymczasowe wzmocnienie dojazdu; montaż, regulacja położenia i łączenie modułów.
Ekipa	5 specjalistów ze Lwowa, ≈ 7 dni w Odessie: mobilizacja, zakwaterowanie, delegacje.

Logistykę skalkulowano bez demontażu obiektów drogowych, wyłączania sieci trakcyjnych i przycinania drzew. Jeżeli oględziny trasy wykażą takie potrzeby, ich budżet zostanie uzgodniony osobno przed wysyłką.

08 / REALIZACJA

Projektowanie i przebieg realizacji

Koszt projektowania i badań wynosi 3 000 EUR z VAT i jest już wliczony do całkowitego budżetu. Przewidziano koncepcję z wizualizacją 3D, pomiar topograficzny i sondowanie gruntu, projekt wykonawczy z częścią dotyczącą dostępności, obliczenia transportowe modułów, projekty instalacji i nadzór autorski.

Etap	Udział	EUR z VAT
Umowa na projektowanie, rozpoczęcie badań	50%	1 500
Przekazanie projektu wykonawczego, przedmiaru i ceny umownej	50%	1 500
Zaliczka na uruchomienie produkcji modułów	50% ceny budowy	118 000
Gotowość modułów w zakładzie i fundamentu palowego	30%	70 800
Montaż, łączenie, podłączenia	15%	35 400
Przekazanie obiektu	5%	11 800

Harmonogram

Projektowanie: 4-5 tygodni od otrzymania danych wejściowych i pierwszej płatności. Produkcja modułów: 7-9 tygodni; równolegle fundament palowy, podest wejściowy i zezwolenia transportowe. Transport, montaż, podłączenia i uruchomienie: 3 tygodnie. Łączny orientacyjny termin: 12-14 tygodni od zaliczki na produkcję.

Cena zakłada rozbieralny budynek modułowy na palach śrubowych i jednostadiowy projekt wykonawczy. Reżim prawny zostanie ustalony przed zawarciem umowy; jeśli wymagane będą ekspertyza lub dodatkowe uzgodnienia, ich zakres i budżet zostaną uzgodnione osobno.

09 / WARUNKI

Zakres dostawy i warunki handlowe

Co obejmuje budżet

Projektowanie i badania; fundament palowy z rusztem; trzy moduły gotowe fabrycznie z pokryciem dachowym, elewacją, oknami, drzwiami, wykończeniem i kabinami sanitarnymi; podest wejściowy, schody, pochylnia, zadaszenie, ławki; meble w zabudowie; wentylacja, ogrzewanie, chłodzenie, ciepła woda, wyposażenie sanitarne, instalacja elektryczna, sygnalizacja, przyzywanie pomocy; transport Lwów - Odessa, dźwigi, montaż, zakwaterowanie ekipy; założone przyłącza do 30 m; próby, dokumentacja, szkolenie.

Oddzielny budżet zamawiającego

- Zagospodarowanie terenu: nawierzchnie, ścieżki, zieleń, oświetlenie terenu, ogrodzenie; tablice informacyjne.
- Opłaty operatorów za przyłączenie i wydanie warunków technicznych, zwiększenie mocy po stronie właściciela sieci.
- Pale dłuższe niż 3,0 m, prace w szczególnych warunkach gruntowych; ekspertyza i dodatkowe etapy projektu, jeśli będą wymagane.
- Demontaż obiektów drogowych, wyłączanie sieci trakcyjnych, przycinanie drzew na trasie transportu.
- Zasilanie rezerwowe, monitoring wizyjny, pochylnia o nachyleniu 5%, dobudowana szafa techniczna - opcje.

Cena i umowa

Wycena z 17.09.2026, ważna przez 60 dni kalendarzowych. Waluta wyceny: EUR; dla porównywalności uwzględniono VAT 20% w Ukrainie. Płatność w hrywnach według uzgodnionych zasad przeliczenia. Jest to wstępna oferta handlowa, a nie kosztorys wiążący: po opracowaniu projektu ilości i ceny dostawców zostaną doprecyzowane dla poszczególnych pozycji; zmiany zakresu będą uzgadniane przed wykonaniem. Opłacone projektowanie nie będzie naliczane ponownie.

Okresy gwarancji, zasady serwisu i odpowiedzialność zostaną określone w umowie z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów i gwarancji producentów. Przekazanie obejmuje dokumentację techniczną urządzeń, protokoły prób, schematy powykonawcze i instruktaż personelu.

10 / ŹRÓDŁA I KONTAKT

Podstawy oferty i dane kontaktowe

Materiały wyjściowe

Układ funkcjonalny „Szatnia”, specyfikacja modułowego budynku szatni (męskiej i damskiej) oraz wizualizacje zamawiającego z 16.09.2026. Oferta Bud Frank uwzględnia własny standard wyposażenia, wskazane zmiany (pochylnia 8%, natryski bez barier, ocieplenie dachu 200 + 100 mm, zadaszenie według wizualizacji) oraz odrębną organizację wykonania prac ze Lwowa.

Jak ustalono wstępną cenę

Limity budżetowe określono na podstawie ilości przeliczonych według geometrii układu i przyjętego standardu, z uwzględnieniem kosztu prac specjalistycznych, materiałów i urządzeń. Udziały zasobów są założeniami kosztorysowymi do czasu opracowania projektu wykonawczego i skierowania zapytań do dostawców. Poniższe katalogi potwierdzają typ i deklarowane przez producentów właściwości materiałów; nie potwierdzają cen zakupu, dostępności w Ukrainie ani zgodności gotowego budynku z normami.

Źródła techniczne

M1 · Ruukki T20 · profil i warianty powłoki

M2 · Alucobond A2 · niepalne płyty kompozytowe

M3 · GEZE / dormakaba · napędy drzwi rozwieranych

M4 · Geberit, Villeroy & Boch ViCare, HEWI · wyposażenie sanitarne i dostępność

M5 · Daikin / Mitsubishi Electric · inwerterowe systemy split

N1 · ЄДЕССБ · rejestr norm budowlanych

Odniesienia normatywne: DBN B.2.2-40, B.2.2-13, B.2.2-9, B.1.1-7, B.2.5-56, B.2.5-64, B.2.5-67, B.2.6-31, Przepisy ruchu drogowego (pkt 22.5), uchwała Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 30 z 18.01.2001. Projektant stosuje aktualne wersje i zmiany obowiązujące w dniu projektowania.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „BUDFRANK”

Kod ЄДРПОУ (ukraiński rejestr przedsiębiorstw): 44168871

79026, Ukraina, Lwów, ul. Stryjska 45

+380 98 441 60 91 · [instagram.com/budfrank.ua](https://www.instagram.com/budfrank.ua)

Z poważaniem, Witalij Habow
CEO / dyrektor TOW „BUDFRANK”
